



***Comune di  
Bisceglie  
BT***

# **MONITORAGGIO DEI LAVORI PUBBLICI**

**Stato di attuazione al 15 maggio 2015**



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO**    **Ampliamento loculi cimitero comunale**


**Descrizione**    Priorità: alta - Personale dedicato: Ing. Antonio Gadaleta D5 - Progettazione e Direzione Lavori, Geom. Seccia Giuseppe C1

**Stato realizzazione**    Capitolo di riferimento n.7363 - Ampliamento dell'isola XIII e XIV del Cimitero Comunale (Cap. Ent.694/2008) - Stanziamento € 1900000 - Impegnati € 1893877,71 - Liquidati € 4580

Destinazione delle spese	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
<b>Copertura finanziaria, di cui:</b>	900.000,00	0,00	0,00
- Importo delle lavorazioni	0,00		
- Somme a disposizione	900.000,00		

**Tipologia d'intervento** Ampliamento  
**Categoria d'opera** Culto  
**Responsabile** Geom. Di Pierro  
**Approvato nel programma** 2007-2009

**Totali S.A.L. maturati alla data odierna**

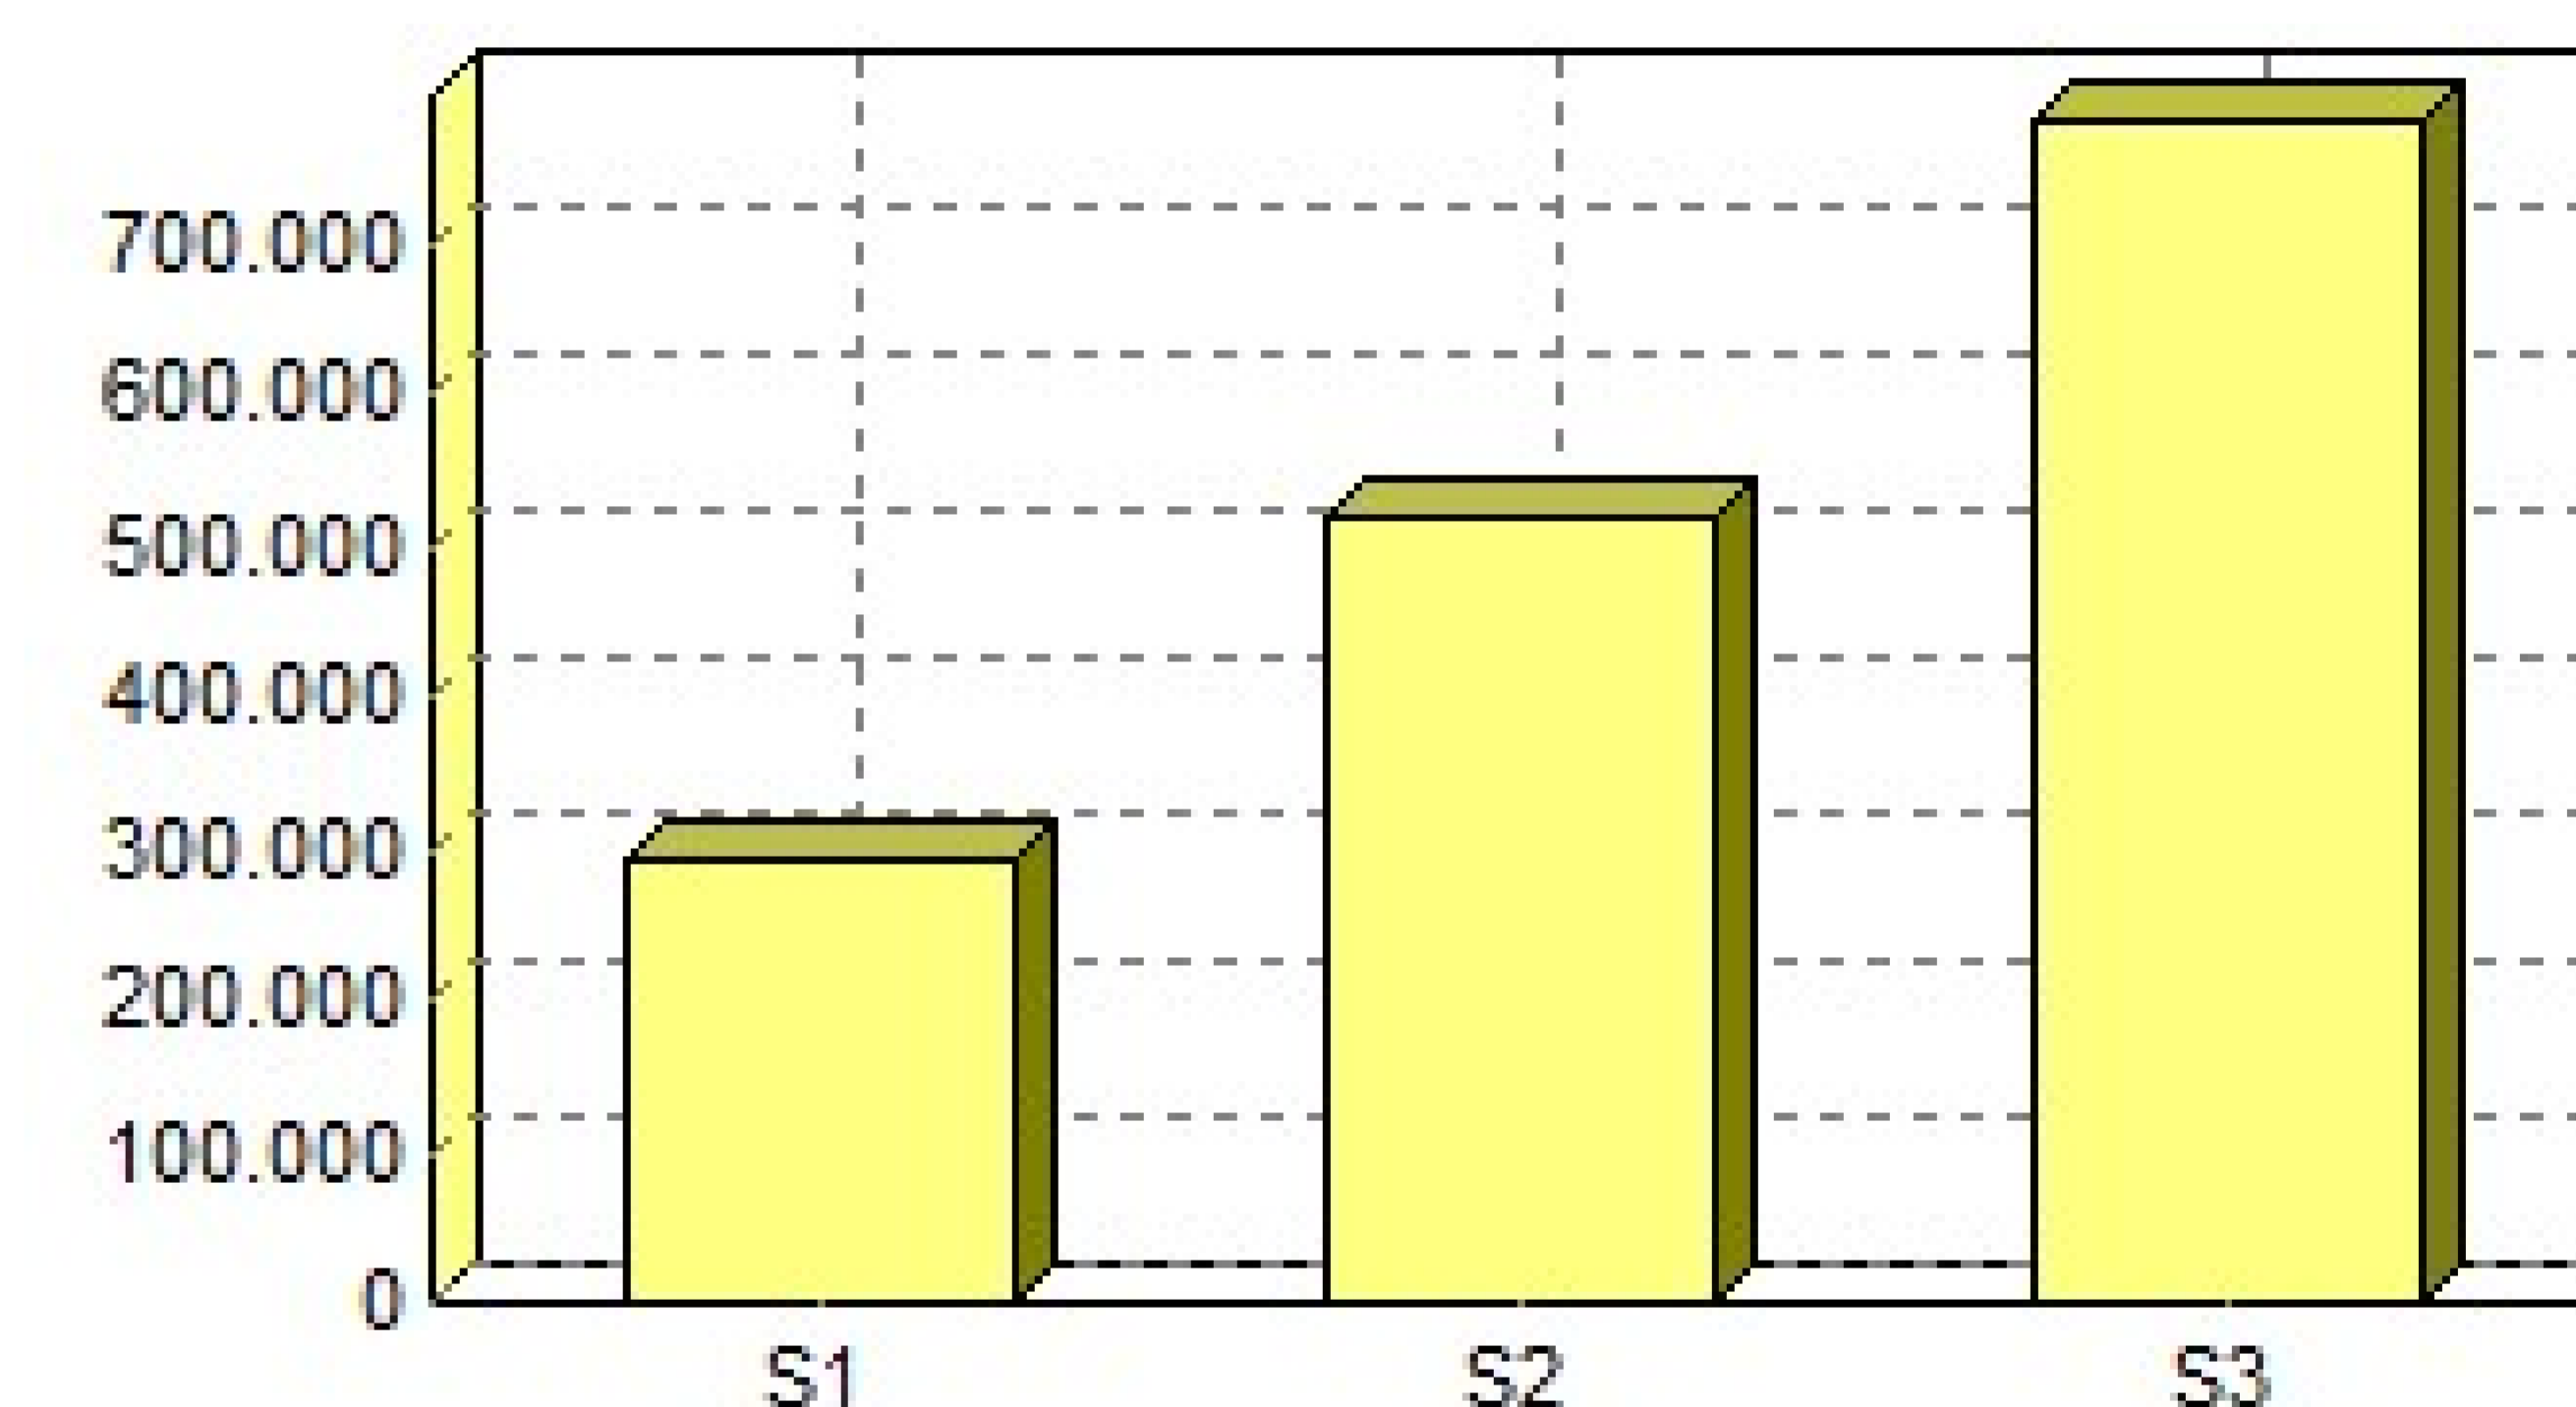



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO**

**Ampliamento loculi cimitero comunale**

**Analisi degli scostamenti**

	Previsione			Effettivo			Scostamento	Note	
	Data inizio	Data fine	Durata	Data inizio	Data fine	Durata			
1	Progettazione preliminare								
2	Progettazione definitiva								
3	Progettazione esecutiva								
4	Gara d'appalto								
5	Contratto d'appalto								
6	Consegna lavori								
7	Esecuzione lavori								
8				01/01/2014	29/04/2014	118			
9	Utilizzo dell'opera								

**Note sugli scostamenti**

Stato di attuazione al 31/12/14:  
Approvato certificato regolare esecuzione con DD n.76 del 29/4/2014

DETTAGLIO S.A.L.		IMPORTO MATURATO	PROGRESSIVO in valore	in %
7-01	Esecuzione lavori - SAL 01	293.730,19	293.730,19	21,66
7-02	Esecuzione lavori - SAL 02	227.445,24	521.175,43	38,44
7-03	Esecuzione lavori - SAL 03	260.350,73	781.526,16	57,65
<b>7-04</b>	<b>Esecuzione lavori - SAL 04</b>	<b>453.549,97</b>	<b>1.235.076,13</b>	<b>91,11</b>
<b>7-05</b>	<b>Esecuzione lavori - SAL 05</b>	<b>120.511,49</b>	<b>1.355.587,62</b>	<b>100,00</b>



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO** **Attuazione nuovo PEEP**

**Descrizione**      Priorità: alta - Personale dedicato: Arch. Losapio Giacomo Dirigente, Geom.Porcelli Stefano D1 - Di Pierro Bartolo D1 - Geom. Seccia Giuseppe C1

Stato realizzazione

Destinazione delle spese	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Totali S.A.L. maturati alla data odierna
<b>Copertura finanziaria, di cui:</b>	3.300.000,00	0,00	0,00	
- Importo delle lavorazioni	0,00			
- Somme a disposizione	3.300.000,00			
<b>Tipologia d'intervento</b> Altro				
<b>Categoria d'opera</b> Infrastrutture per attività industriali				
<b>Responsabile</b> Arch. Losapio				
<b>Approvato nel programma</b> 2009-2011				



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO**

**Attuazione nuovo PEEP**

**Analisi degli scostamenti**

	Previsione			Effettivo			Scostamento	Note
	Data inizio	Data fine	Durata	Data inizio	Data fine	Durata		

- 1 Progettazione preliminare
- 2 Progettazione definitiva
- 3 Progettazione esecutiva
- 4 Gara d'appalto
- 5 Contratto d'appalto
- 6 Consegna lavori
- 7 Esecuzione lavori
- 8 Collaudo tecnico amministrativo
- 9 Utilizzo dell'opera

01/01/2014 31/12/2014 364

**Note sugli scostamenti**

Stato di attuazione al 31/12/2014:  
Nel corso del 2014 il Consorzio Bisceglie 167 ha provveduto all'esecuzione dei lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

DETTAGLIO S.A.L.	IMPORTO MATURATO	PROGRESSIVO in valore	in %



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO** **Manutenzione straordinaria Cimitero Comunale**

**Descrizione** Priorità: media - Personale dedicato: Arch. Losapio Giacomo Dirigente - Ing. Antonio Gadaleta D5 - Co-direzione lavori - Geom.Porcelli Stefano D1 - Di Pierro Bartolo D1 - Geom. Seccia Giuseppe C1

**Stato realizzazione** Capitolo di riferimento n..7370 -Manutenzione straordinaria Cimitero comunale ((Adegauamenti, ristrutturazione - restauro)- 2°lotto (Cap. Ent. 690/2012-2013-2014) - Stanziamento€ 1.000.000 - Impegnati €0,00 - Liquidati €0,00

Destinazione delle spese	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Totali S.A.L. maturati alla data odierna
<b>Copertura finanziaria, di cui:</b>	1.030.000,00	0,00	0,00	
- Importo delle lavorazioni	0,00			
- Somme a disposizione	1.030.000,00			
<b>Tipologia d'intervento</b>	Manutenzione straordinaria			
<b>Categoria d'opera</b>	Culto			
<b>Responsabile</b>	Geom. Di Pierro			
<b>Approvato nel programma</b>	2007-2009			



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO**

**Manutenzione straordinaria Cimitero Comunale**

**Analisi degli scostamenti**

	Previsione			Effettivo			Scostamento	Note	
	Data inizio	Data fine	Durata	Data inizio	Data fine	Durata			
1	Progettazione preliminare								
2	Progettazione definitiva								
3	Progettazione esecutiva								
4	Gara d'appalto								
5	Contratto d'appalto								
6	Consegna lavori								
7	Esecuzione lavori								
8				01/01/2014	31/12/2014	364		Certificato di regolare esecuzione	
9	Utilizzo dell'opera								

**Note sugli scostamenti**

Stato di attuazione al 31/12/14:  
Nel corso del 2014 si è provveduto alle operazioni di collaudo, tuttora in corso di esecuzione, a causa di alcuni contenziosi in corso con la ditta appaltatrice.

DETTAGLIO S.A.L.	IMPORTO MATURATO	PROGRESSIVO in valore	in %



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO Opere di urbanizzazione primaria area PEEP nel centro storico**

**Descrizione** Priorità: media - Personale dedicato: Arch. Losapio Giacomo Dirigente - Ing. Antonio Gadaleta D5 - Co-direzione lavori - Geom.Porcelli Stefano D1 - Di Pierro Bartolo D1

**Stato realizzazione** Capitolo di riferimento n..5750 - Interventi di riqualificazione ambientale centro antico (eliminazione antenne) (Cap. Entr.946/2012) - Stanziamento € 150000 - Impegnati €0,00 - Liquidati €0,00

Destinazione delle spese	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Totali S.A.L. maturati alla data odierna
<b>Copertura finanziaria, di cui:</b>	764.984,66	0,00	0,00	
- Importo delle lavorazioni	0,00			
- Somme a disposizione	764.984,66			
<b>Tipologia d'intervento</b> Altro				
<b>Categoria d'opera</b> Igienico sanitario				
<b>Responsabile</b> Arch. Losapio				
<b>Approvato nel programma</b> 2004-2006				





**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO**

**Opere di urbanizzazione primaria area PEEP nel centro storico**

**Analisi degli scostamenti**

	Previsione			Effettivo			Scostamento	Note	
	Data inizio	Data fine	Durata	Data inizio	Data fine	Durata			
1	Progettazione preliminare								
2	Progettazione definitiva								
3	Progettazione esecutiva								
4	Gara d'appalto								
5	Contratto d'appalto								
6	Consegna lavori								
7	Esecuzione lavori								
8				01/01/2014	07/04/2014	96			
9	Utilizzo dell'opera								

**Note sugli scostamenti**

Stato di attuazione al 31/12/14:  
Approvato collaudo tecnico amministrativo con DD n.64 del 7/4/2014. .

DETTAGLIO S.A.L.	IMPORTO MATURATO	PROGRESSIVO in valore	in %



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*


**LAVORO PUBBLICO PRU - Piscina coperta di via U. La Malfa**

**Descrizione**      Priorità: alta - Personale dedicato: Arch. Losapio Giacomo Dirigente - Geom.Porcelli Stefano D1

**Stato realizzazione**      Capitolo di riferimento n..4801 - Realizzazione piscina coperta Via U. La Malfa - quartiere S. Pietro (Cap. Entr.791-906-1082/2008) - Stanziamento € 440000 - Impegnati € 440000 - Liquidati € 0,00

Destinazione delle spese	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
<b>Copertura finanziaria, di cui:</b>	4.706.000,00	0,00	0,00
- Importo delle lavorazioni	0,00		
- Somme a disposizione	4.706.000,00		
<b>Tipologia d'intervento</b>	Nuova costruzione		
<b>Categoria d'opera</b>	Sport e spettacolo		
<b>Responsabile</b>	Arch. Losapio		
<b>Approvato nel programma</b>	2004-2006		

**Totali S.A.L. maturati alla data odierna**

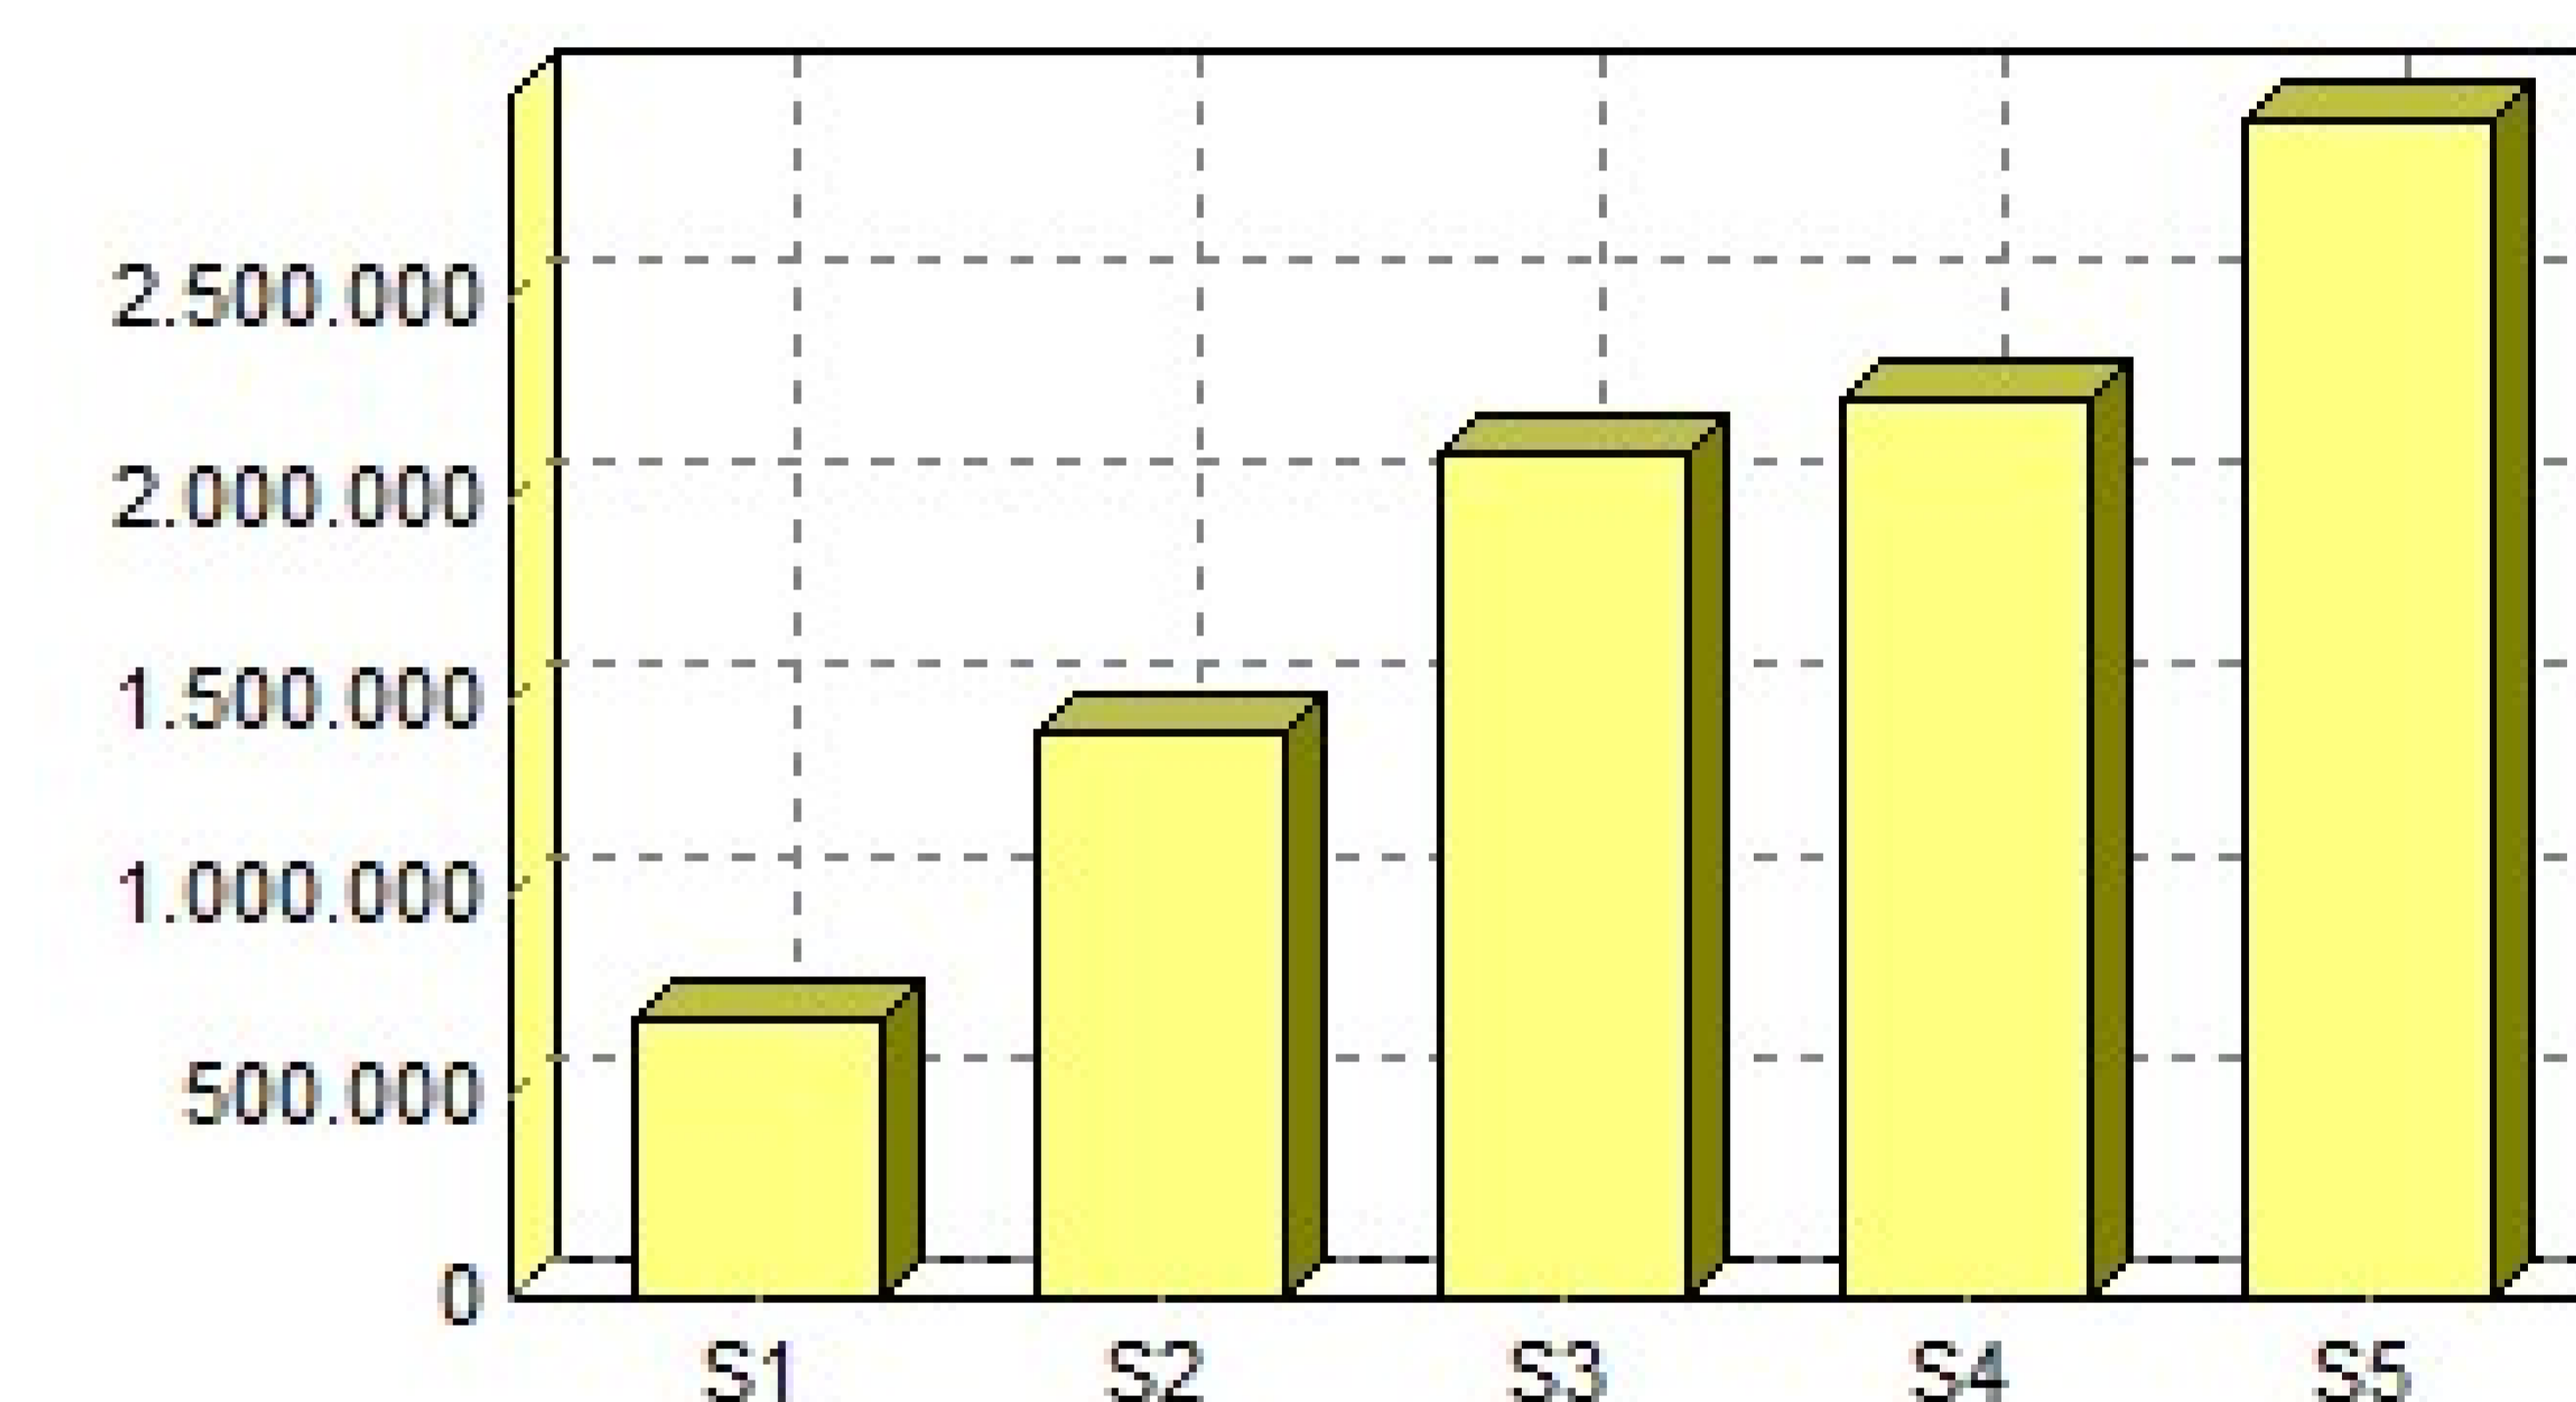



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO**

**PRU - Piscina coperta di via U. La Malfa**

**Analisi degli scostamenti**

	Previsione			Effettivo			Scostamento	Note	
	Data inizio	Data fine	Durata	Data inizio	Data fine	Durata			
1	Progettazione preliminare								
2	Progettazione definitiva								
3	Progettazione esecutiva								
4	Gara d'appalto								
5	Contratto d'appalto								
6	Consegna lavori								
7	Esecuzione lavori								
8				01/01/2014	31/12/2014	364			
9	Utilizzo dell'opera								

**Note sugli scostamenti**

Trattasi di opera da realizzare mediante la compartecipazione di risorse finanziarie di Regione, Stato, privati e Comune.

Stato di attuazione al 31/12/14:

Risultano in corso le operazioni di collaudo tecnico amministrativo.

DETTAGLIO S.A.L.		IMPORTO MATURATO	PROGRESSIVO in valore	in %
7-01	Esecuzione lavori - SAL 01	703.875,57	703.875,57	23,89
7-02	Esecuzione lavori - SAL 02	702.627,31	1.406.502,88	47,75
7-03	Esecuzione lavori - SAL 03	700.987,21	2.107.490,09	71,54
7-04	Esecuzione lavori - SAL 04	140.911,60	2.248.401,69	76,33
7-05	Esecuzione lavori - SAL 05	697.125,27	2.945.526,96	100,00



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO Realizzazione asilo Nido nel quartiere di Levante**

**Descrizione** Realizzazione asilo Nido nel quartiere di Levante

Stato realizzazione

Destinazione delle spese	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totali S.A.L. maturati alla data odierna
<b>Copertura finanziaria, di cui:</b>	1.350.000,00	0,00	0,00	
- Importo delle lavorazioni	0,00			
- Somme a disposizione	1.350.000,00			
<b>Tipologia d'intervento</b>	Nuova costruzione			
<b>Categoria d'opera</b>	Edilizia sociale e scolastica			
<b>Responsabile</b>	Arch. Losapio			
<b>Approvato nel programma</b>	2012-2014			



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO**

**Realizzazione asilo Nido nel quartiere di Levante**

**Analisi degli scostamenti**

	Previsione			Effettivo			Scostamento	Note	
	Data inizio	Data fine	Durata	Data inizio	Data fine	Durata			
1	Progettazione preliminare								
2	Progettazione definitiva								
3	Progettazione esecutiva								
4	Gara d'appalto								
5	Contratto d'appalto								
6	Consegna lavori								
7				01/01/2014	31/12/2014	364			
8	Collaudo tecnico amministrativo								
9	Utilizzo dell'opera								

**Note sugli scostamenti**

Stato di attuazione al 31/12/14:  
I lavori sono tuttora in corso in esecuzione.

DETTAGLIO S.A.L.	IMPORTO MATURATO	PROGRESSIVO in valore	in %



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO** **Recupero isolati n.23,24,25,26,65,70 nel centro storico**

**Descrizione**      Priorità: alta - Personale dedicato: Arch. Losapio Giacomo Dirigente -Geom.Porcelli Stefano D1

Stato realizzazione

Destinazione delle spese	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Totali S.A.L. maturati alla data odierna
<b>Copertura finanziaria, di cui:</b>	4.131.655,00	0,00	0,00	
- Importo delle lavorazioni	0,00			
- Somme a disposizione	4.131.655,00			
<b>Tipologia d'intervento</b> Recupero				
<b>Categoria d'opera</b> Altro				
<b>Responsabile</b> Arch. Losapio				
<b>Approvato nel programma</b> 2007-2009				



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO**

**Recupero isolati n.23,24,25,26,65,70 nel centro storico**

**Analisi degli scostamenti**

	Previsione			Effettivo			Scostamento	Note
	Data inizio	Data fine	Durata	Data inizio	Data fine	Durata		

- 1 Progettazione preliminare
- 2 Progettazione definitiva
- 3 Progettazione esecutiva
- 4 Gara d'appalto
- 5 Contratto d'appalto
- 6 Consegna lavori
- 7 Esecuzione lavori
- 8 Collaudo tecnico amministrativo
- 9 Utilizzo dell'opera

**Note sugli scostamenti**

Stato di attuazione al 31/12/14  
Trattasi di intervento, iniziato nel 1994.  
Per la realizzazione dell'opera si resta in attesa della trasmissione della convenzione,  
vistata dalla Corte dei Conti, da parte del Ministero delle Infrastrutture..

DETTAGLIO S.A.L.	IMPORTO MATURATO	PROGRESSIVO in valore	in %



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO** **Riqualificazione della passeggiata su via Sauro**


**Descrizione**

Riqualificazione della passeggiata su via Sauro - riconversione e riqualificazione del tratto di mura tra il torrione S. Angelo e il Bastione S. Martino e dei percorsi pedonali di largo Porta di Mare e via Pendio Campanile  
- riconversione e riqualificazione del tratto di mura tra il torrione S. Angelo e il Bastione S. Martino e dei percorsi pedonali di largo Porta di Mare e via Pendio Campanile

**Stato realizzazione**

Destinazione delle spese	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<b>Copertura finanziaria, di cui:</b>	2.420.000,00	0,00	0,00
- Importo delle lavorazioni	0,00		
- Somme a disposizione	2.420.000,00		
<b>Tipologia d'intervento</b>	Ristrutturazione		
<b>Categoria d'opera</b>	Stradali		
<b>Responsabile</b>	Arch. Losapio		
<b>Approvato nel programma</b>	2012-2014		

**Totali S.A.L. maturati alla data odierna**

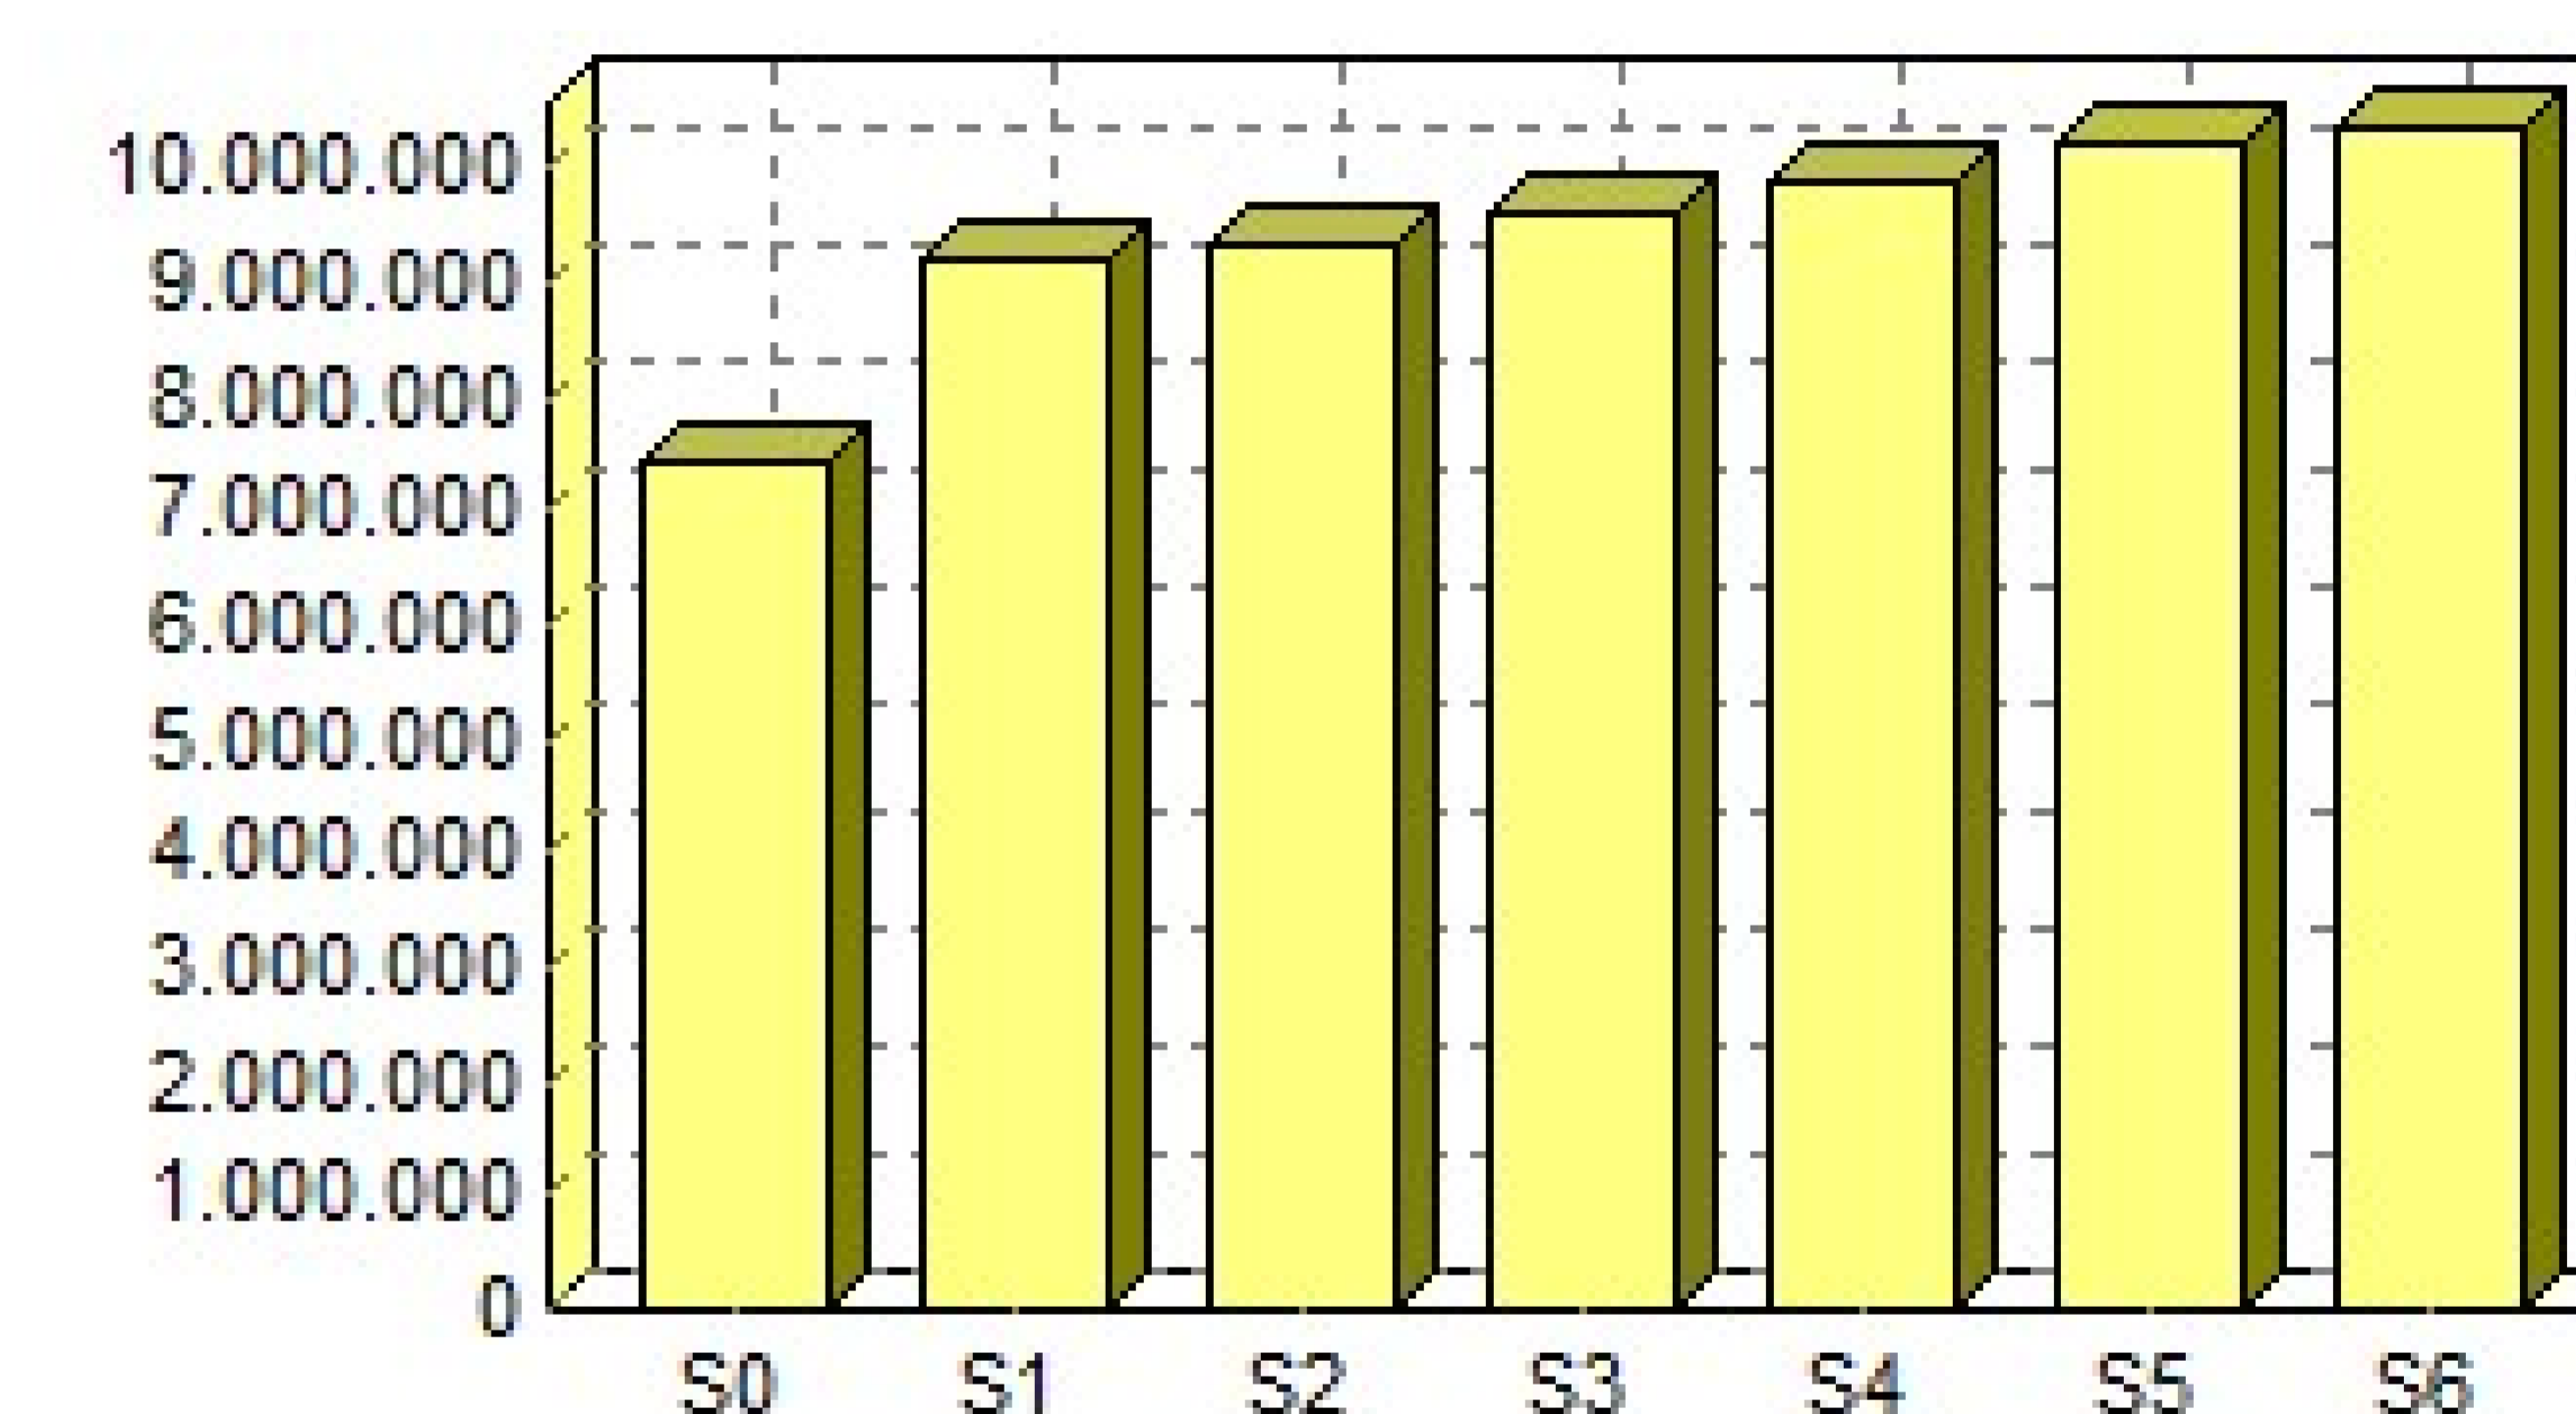





**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO**

**Riqualificazione della passeggiata su via Sauro**

**Analisi degli scostamenti**

	Previsione			Effettivo			Scostamento	Note	
	Data inizio	Data fine	Durata	Data inizio	Data fine	Durata			
1	Progettazione preliminare								
2	Progettazione definitiva								
3	Progettazione esecutiva								
4	Gara d'appalto								
5	Contratto d'appalto								
6	Consegna lavori								
7				01/01/2014	31/12/2014	364			
8	Collaudo tecnico amministrativo								
9	Utilizzo dell'opera								

**Note sugli scostamenti**

Stato di attuazione al 31/12/14  
I lavori risultano in fase di ultimazione  
Liquidati n.4 SAL:  
- n.3 con atto n.152 del 25/6/14 per €276 540;  
- n.4 con atto n. 155 del 7/7/14 per €276 540.  
- n.5 con atto n. 243 del 18/11/14 per €307 560;  
- n.6 con atto n.244 del 21/11/14 per €164560.

DETTAGLIO S.A.L.		IMPORTO MATURATO	PROGRESSIVO in valore	in %
7-01	Esecuzione lavori - SAL 01	7.465.997,00	7.465.997,00	72,00
7-02	Esecuzione lavori - SAL 02	1.711.602,00	9.177.599,00	88,51
7-03	Esecuzione lavori - SAL 03	165.990,00	9.343.589,00	90,11
7-04	Esecuzione lavori - SAL 04	276.540,00	9.620.129,00	92,77
7-05	Esecuzione lavori - SAL 05	276.540,00	9.896.669,00	95,44
7-06	Esecuzione lavori - SAL 06	307.560,00	10.204.229,00	98,41
7-07	Esecuzione lavori - SAL 07	164.560,00	10.368.789,00	100,00



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO Scuola dell'infanzia via L. Cadorna**

**Descrizione**

**Stato realizzazione**

Destinazione delle spese	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totali S.A.L. maturati alla data odierna
<b>Copertura finanziaria, di cui:</b>	1.300.000,00	0,00	0,00	
- Importo delle lavorazioni	0,00			
- Somme a disposizione	1.300.000,00			
<b>Tipologia d'intervento</b>	Manutenzione straordinaria			
<b>Categoria d'opera</b>	Edilizia sociale e scolastica			
<b>Responsabile</b>	Arch. Losapio			
<b>Approvato nel programma</b>	2011-2013			



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO**

**Scuola dell'infanzia via L. Cadorna**

**Analisi degli scostamenti**

	Previsione			Effettivo			Scostamento	Note
	Data inizio	Data fine	Durata	Data inizio	Data fine	Durata		

- 1 Progettazione preliminare
- 2 Progettazione definitiva
- 3 Progettazione esecutiva
- 4 Gara d'appalto
- 5 Contratto d'appalto
- 6 Consegna lavori
- 7 Esecuzione lavori
- 8 Collaudo tecnico amministrativo
- 9 Utilizzo dell'opera

				01/01/2014	22/10/2014	294		
--	--	--	--	------------	------------	-----	--	--

**Note sugli scostamenti**

Stato di attuazione al 31/12/14:  
Terminate le procedure di acquisizione delle aree..Approvato progettazione definitiva adeguata con Deliberazione di Giunta Municipale n.320 del 22/10/14.

DETTAGLIO S.A.L.	IMPORTO MATURATO	PROGRESSIVO in valore	in %



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*


**LAVORO PUBBLICO Sistemazione Piazza Castello**

**Descrizione** Sistemazione Piazza Castello (Completamento urbanizzazione PEEP Centro storico)  
Priorità: alta - Personale dedicato: Arch. Losapio Giacomo Dirigente, Geom.Porcelli Stefano D1 - Di Pierro Bartolo D1 - Geom. Seccia Giuseppe C1

Stato realizzazione

Destinazione delle spese	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Copertura finanziaria, di cui:</b>	1.035.000,00	0,00	0,00
- Importo delle lavorazioni	0,00		
- Somme a disposizione	1.035.000,00		
<b>Tipologia d'intervento</b>	Completamento		
<b>Categoria d'opera</b>	Stradali		
<b>Responsabile</b>	Arch. Losapio		
<b>Approvato nel programma</b>	2009-2011		

**Totali S.A.L. maturati alla data odierna**

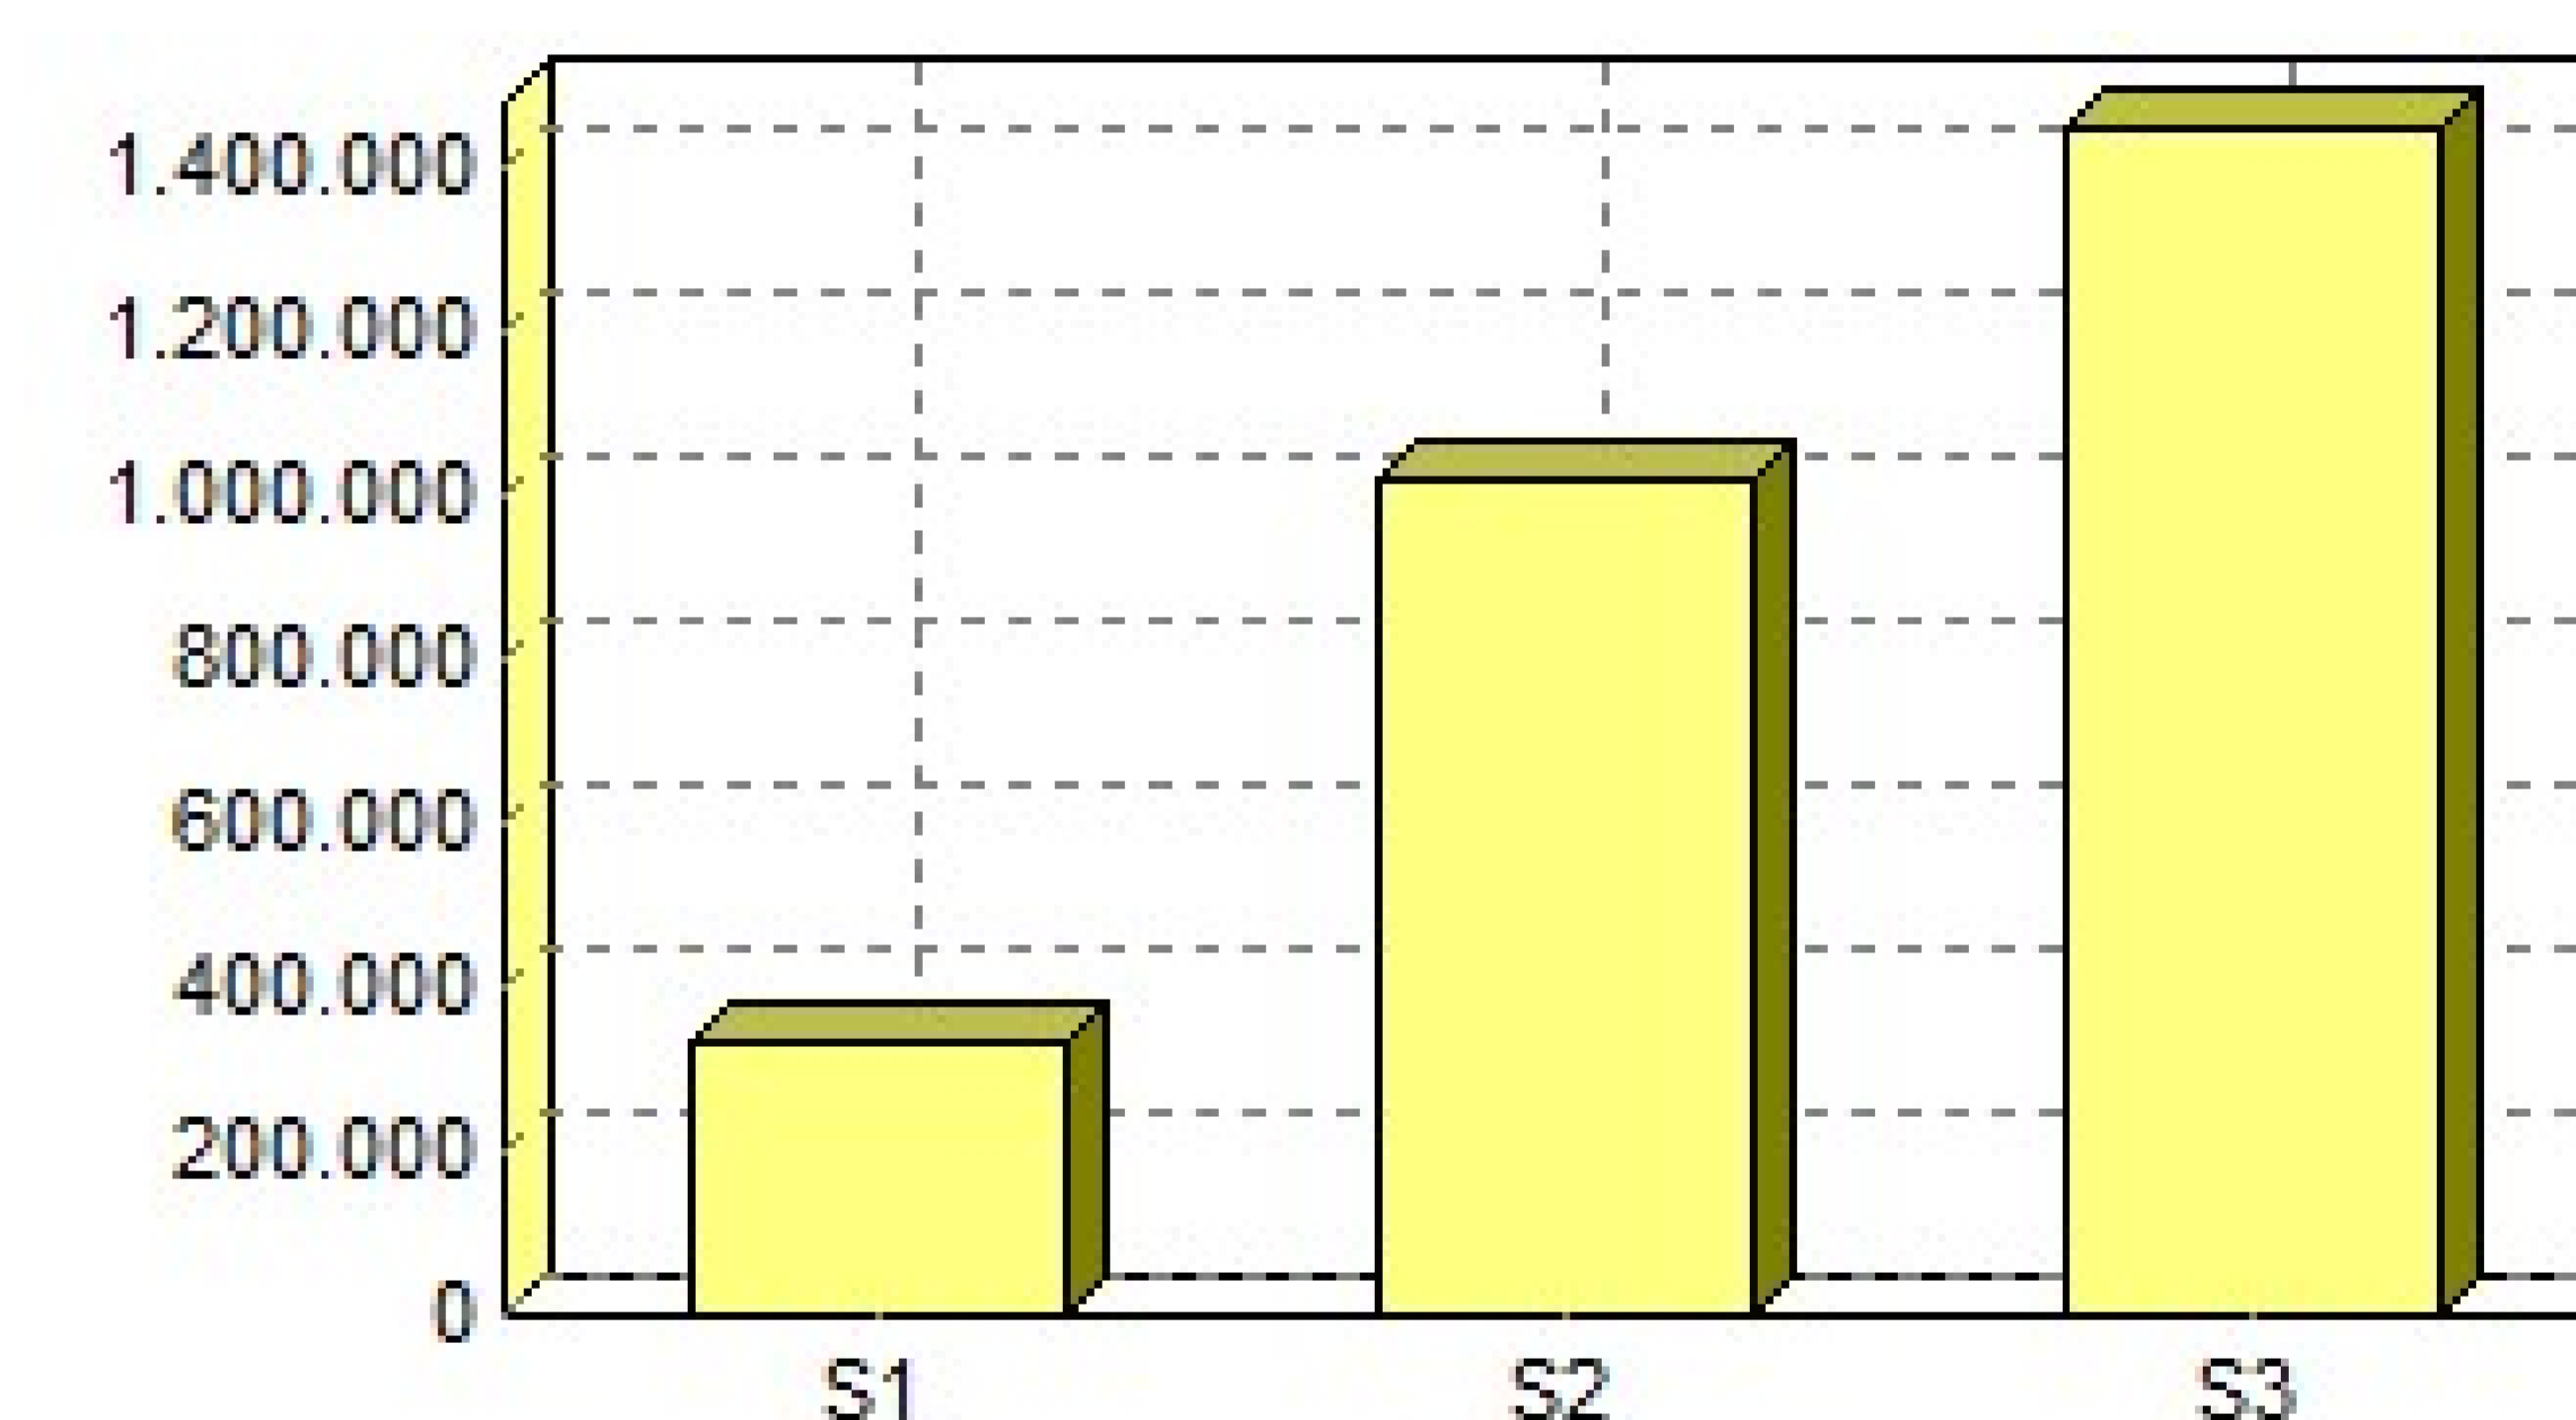



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO**

**Sistemazione Piazza Castello**

**Analisi degli scostamenti**

	Previsione			Effettivo			Scostamento	Note
	Data inizio	Data fine	Durata	Data inizio	Data fine	Durata		
1	Progettazione preliminare							
2	Progettazione definitiva							
3	Progettazione esecutiva							
4	Gara d'appalto							
5	Contratto d'appalto							
6	Consegna lavori							
7				01/01/2014	31/12/2014	364		
8	Collaudo tecnico amministrativo							
9	Utilizzo dell'opera							

**Note sugli scostamenti**

Stato di attuazione al 31/12/14:  
I lavori sono attualmente sospesi. Per la ripresa dei lavori si resta in attesa del parere dell'ARCA. La perizia di variante è stata approvata con DD n.32 del 21/2/14..

DETTAGLIO S.A.L.		IMPORTO MATURATO	PROGRESSIVO in valore	in %
7-01	Esecuzione lavori - SAL 01	330.044,00	330.044,00	22,81
7-02	Esecuzione lavori - SAL 02	691.968,20	1.022.012,20	70,65
7-03	Esecuzione lavori - SAL 03	424.526,30	1.446.538,50	100,00



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*


**LAVORO PUBBLICO Viabilità di collegamento tra Salnitro e via la Marina**

**Descrizione** Viabilità di collegamento tra Salnitro e via la Marina - riqualificazione di via La Spiaggia

**Stato realizzazione**

Destinazione delle spese	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<b>Copertura finanziaria, di cui:</b>	2.300.000,00	0,00	0,00
- Importo delle lavorazioni	0,00		
- Somme a disposizione	2.300.000,00		
<b>Tipologia d'intervento</b>	Ristrutturazione		
<b>Categoria d'opera</b>	Stradali		
<b>Responsabile</b>	Arch. Losapio		
<b>Approvato nel programma</b>	2012-2014		

**Totali S.A.L. maturati alla data odierna**

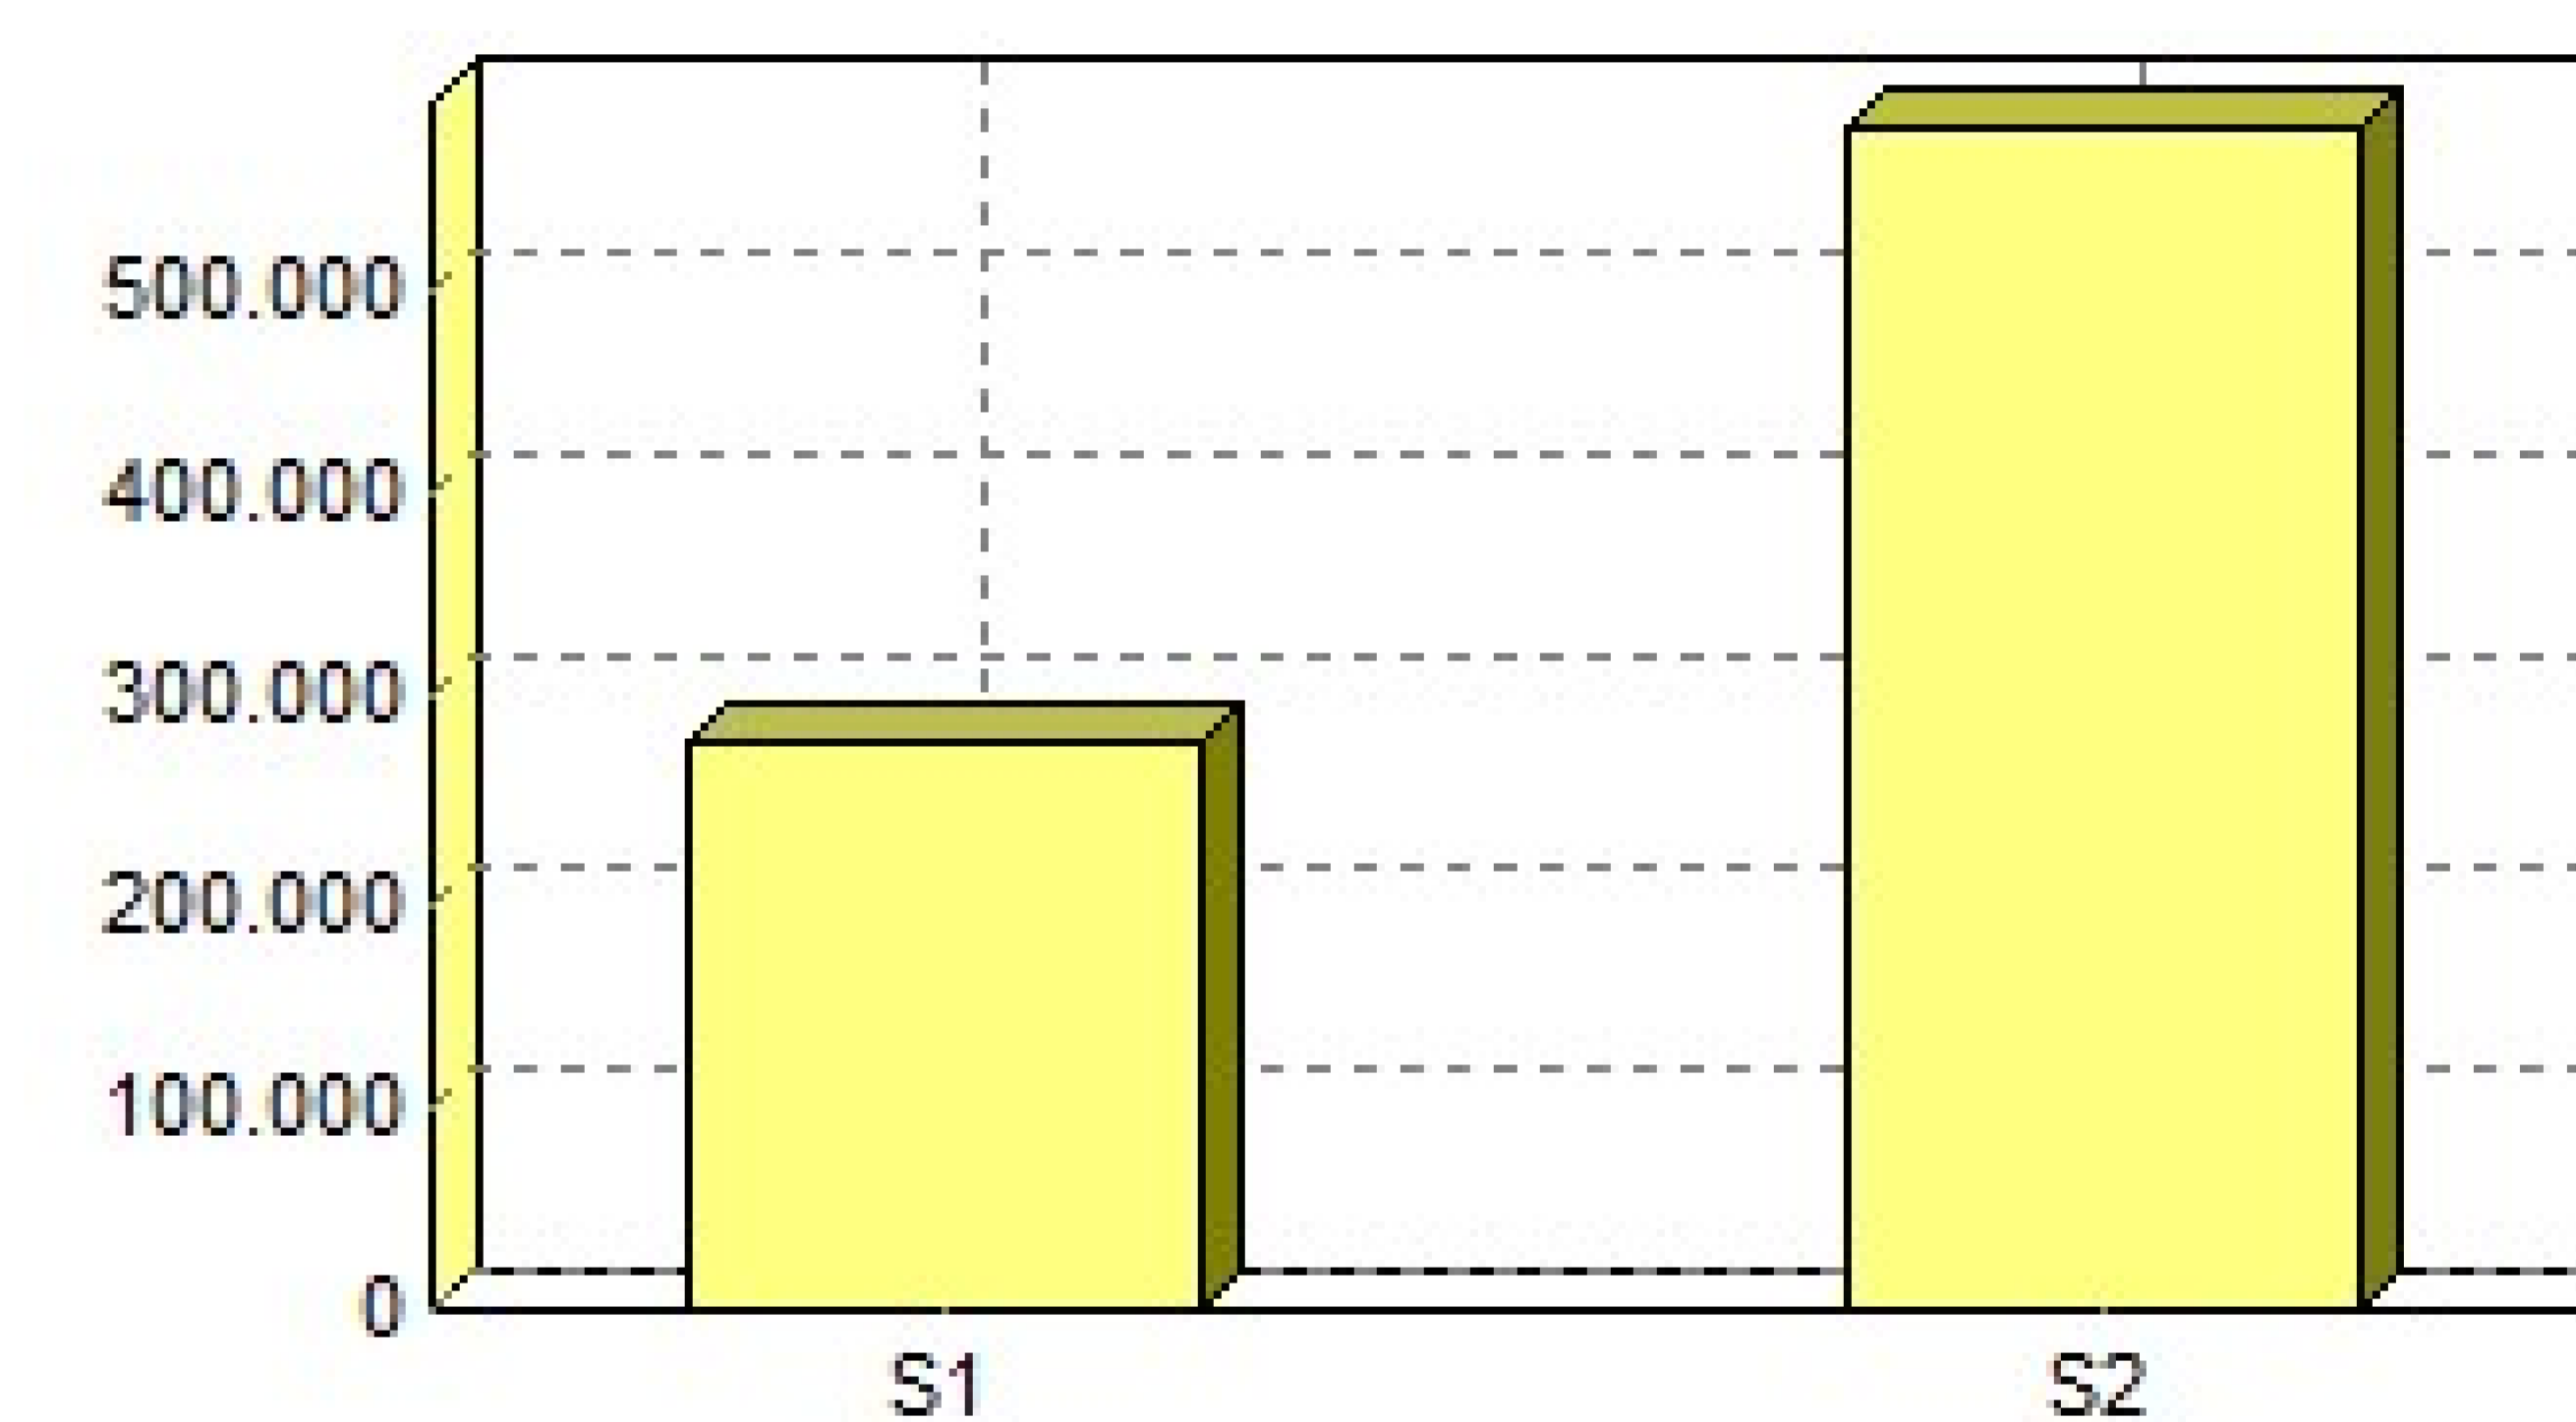



**Comune di Bisceglie**  
**Provincia (BT)**

*Rapporto di controllo sull'avanzamento  
dei lavori aggiornato al 15 maggio 2015*

**LAVORO PUBBLICO**

**Viabilità di collegamento tra Salnitro e via la Marina**

**Analisi degli scostamenti**

	Previsione			Effettivo			Scostamento	Note	
	Data inizio	Data fine	Durata	Data inizio	Data fine	Durata			
1	Progettazione preliminare								
2	Progettazione definitiva								
3	Progettazione esecutiva								
4	Gara d'appalto								
5	Contratto d'appalto								
6	Consegna lavori								
7				01/01/2014	31/12/2014	364			
8	Collaudo tecnico amministrativo								
9	Utilizzo dell'opera								

**Note sugli scostamenti**

Stato di attuazione al 31/12/14:  
Liquidato il SAL n.2 con atto n.246 del 25/11/14 per € 302 170. I lavori risultano in corso di esecuzione.

DETTAGLIO S.A.L.		IMPORTO MATURATO	PROGRESSIVO in valore	in %
7-01	Esecuzione lavori - SAL 01	278.410,00	278.410,00	47,95
7-02	Esecuzione lavori - SAL 02	302.170,00	580.580,00	100,00
